

PLANILHA DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR

Município : INACIO MARTINS - PR		Data base DER : FEVEREIRO 2023 (sem desoneração)				Elaborado em : 24/10/2023	
Trecho :		RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI				Area m²:	2.590,56
						Extensão m:	866,00
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR
CALÇADAS EM CONCRETO E ACESSIBILIDADE							
1 GRUPO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
1.1	531000	DER-PR	Brita graduada 100% PI	m3	201,220	352,07	R\$ 70.843,52
Total do grupo de Serviços de Pavimentação							R\$70.843,52
2 GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES							
2.1 Meio fio e sarjeta							
2.1.2	810150	DER-PR	Meio fio de concreto Tipo 02 (pré-moldado)	m	1.168,000	74,55	R\$ 87.074,40
2.1.3	810650	DER-PR	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - guia rebaixada	m	173,610	62,08	R\$ 10.777,71
Total do grupo dos serviços de drenagem e obras de arte correntes							R\$97.852,11
3 GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
3.1 DEMOLIÇÕES DE CALÇADAS EM CONCRETO E MEIO FIO							
3.1.1	606700	DER-PR	Demolição de concreto simples	m3	122,020	182,25	R\$ 22.238,15
Sub total do item demolições de calçadas em concreto e meio fio							R\$ 22.238,15
3.2 Calçadas em concreto - esp 7,0 cm = 2.590,56 m²							
3.2.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	2.590,56	12,18	R\$ 31.553,02
3.2.2	603900	DER-PR	Lastro de brita	m3	77,710	274,75	R\$ 21.350,82
3.2.3	Cotação	01	Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	m3	181,320	557,02	R\$ 100.998,87
3.2.4	834909	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	580,040	118,35	R\$ 68.647,73
3.2.5	834908	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	m2	121,200	111,28	R\$ 13.487,14
Sub-total do item Calçadas em concreto							R\$236.037,58
3.3 Rampas para P.N.E. em concreto							
3.3.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	229,50	12,18	R\$ 2.795,31

MEDIÇÃO 02

31/05/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS

INICIO DA OBRA: 02/05/2024

TERMINO PREVISTO DA OBRA: 29/10/2024

	MEDIÇÃO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
0,00%		0,00	0,00	0,00
0,00%		0,00	0,00	0,00
0,00%		0,00	0,00	0,00
78,61%	95,92	17.481,42	95,92	17.481,42
0,00%		0,00	0,00	0,00
0,00%		0,00	0,00	0,00
0,00%		0,00	0,00	0,00
0,00%		0,00	0,00	0,00
0,00%		0,00	0,00	0,00
0,00%		0,00	0,00	0,00

3.3.2	603900	DER-PR	Lastro de brita	m3	6,850	274,76	R\$ 1.882,11	0,00%		0,00	0,00	0,00
3.3.3	Cotação	01	Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	m3	16,050	557,01	R\$ 8.940,01	0,00%		0,00	0,00	0,00
3.3.4	834908	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	m2	21,600	111,26	R\$ 2.403,22	0,00%		0,00	0,00	0,00
				Sub-total do item Rampas para P.N.E. em concreto				R\$16.020,64				
				Total do Grupo dos Serviços Complementares				R\$274.296,37				
				TOTAL DA OBRA COM BDI				R\$442.992,00				
				Quatrocentos e quarenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais								
				INACIO MARTINS, 31 DE MAIO DE 2024								
CALÇADAS EM CONCRETO E ACESSIBILIDADE - CONVENIO 025/2023 - SEIL												
Contratada: Marly Corvolan Hilario				Keury Fabris Marcon								
CNPJ.: 029.958.184/0001-89				Engenheiro Civil								
Contrato: 026/2024				CREA PR 148398/D RNP 17 14 63 99 91								
Concorrência Eletrônica 001/2024				MEDIÇÃO 02				ART de Execução 17 2024 22 33 000				

% PERIODO	3,95%	% ACUM	3,95%
MEDIÇÃO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
R\$ 17.481,42		R\$ 17.481,42	
Dezesete mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos			
Edison dos Santos Pepe			
Engenheiro Civil			
CREA PR 130743/D RNP 17 11 87 89 87			
ART de Fiscalização 17 2023 27 87 909			



MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

MUNICÍPIO LOCAL	INÁCIO MARTINS RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI
CONTRATADA CONTRATO Nº OBJETO	CONSTRUTORA MARLY CORVOLAN HILARIO 026/2024 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE
MEDIÇÃO Nº DATA DA VISTORIA	02 31/05/2024

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 02/05/2024 até 31/05/2024.

Imagem 01 – Foto aérea do local dos serviços de demolições executadas – Rua Nair Bastos Druciaki






MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 02 – Demolição de meio fio e calçadas existentes



Imagem 03 – Demolição de meio fio e calçadas existentes

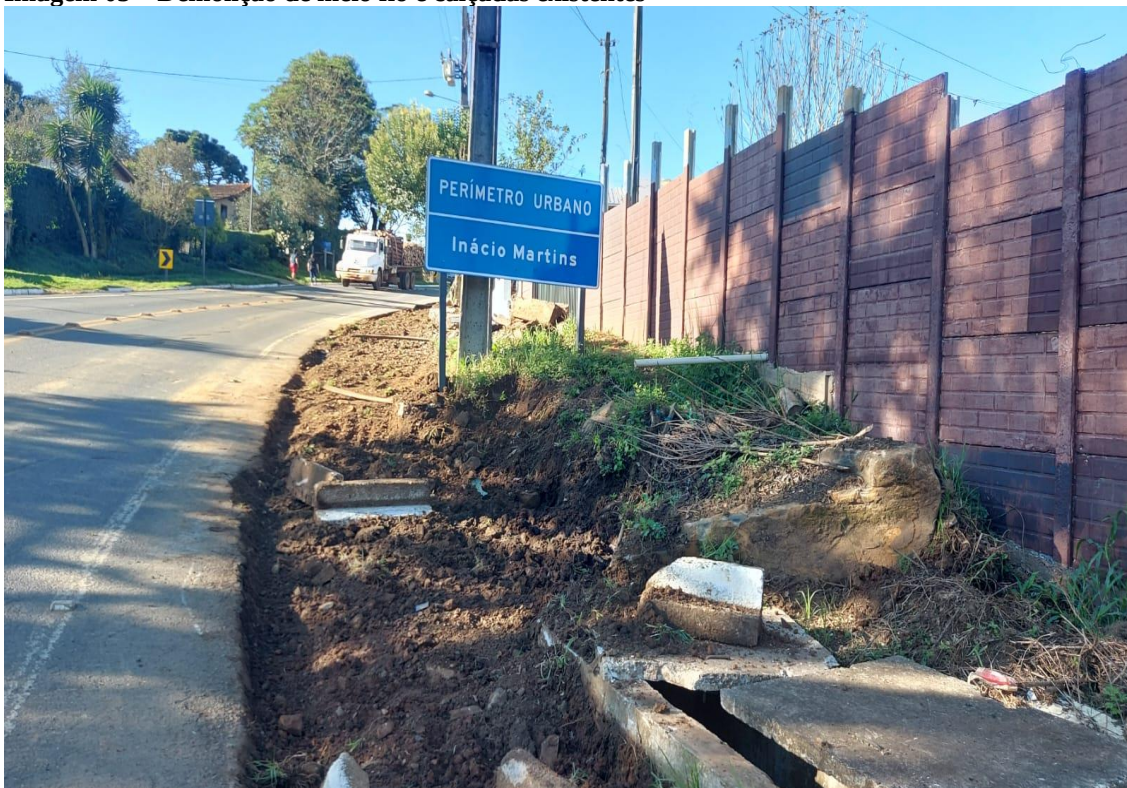



MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 04 – Demolição de meio fio e calçadas existentes



Imagem 05 – Demolição de meio fio e calçadas existentes





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 06 – Demolição de meio fio e calçadas existentes



Imagem 07 – Demolição de meio fio e calçadas existentes





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. GRUPO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Nada incluído nesta medição	

2. GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Nada incluído nesta medição	

3. GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolição de concreto simples	95,92 m ³

Inácio Martins, 31 de maio de 2024.

Edison dos Santos Pepe
Engenheiro Civil
CREA PR 130743/D
ART de fiscalização 17 2023 27 87 909
