

PLANILHA DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR

Município : INACIO MARTINS - PR			Data base DER : FEVEREIRO 2023 (sem desoneração)			Elaborado em : 24/10/2023	
Trecho : RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI						Area m²:	2.590,56
						Extensão m:	866,00
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR
CALÇADAS EM CONCRETO E ACESSIBILIDADE							
1	GRUPO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
1.1	531000	DER-PR	Brita graduada 100% PI	m3	201,220	352,07	R\$ 70.843,52
			Total do grupo de Serviços de Pavimentação				R\$70.843,52
2	GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES						
2.1	Meio fio e sarjeta						
2.1.2	810150	DER-PR	Meio fio de concreto Tipo 02 (pré-moldado)	m	1.168,000	74,55	R\$ 87.074,40
2.1.3	810650	DER-PR	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - guia rebaixada	m	173,610	62,08	R\$ 10.777,71
			Total do grupo dos serviços de drenagem e obras de arte correntes				R\$97.852,11
3	GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.1	DEMOLIÇÕES DE CALÇADAS EM CONCRETO E MEIO FIO						
3.1.1	606700	DER-PR	Demolição de concreto simples	m3	122,020	182,25	R\$ 22.238,15
			Sub total do item demolições de calçadas em concreto e meio fio				R\$ 22.238,15
3.2	Calçadas em concreto - esp 7,0 cm = 2.590,56 m²						
3.2.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	2.590,56	12,18	R\$ 31.553,02
3.2.2	603900	DER-PR	Lastro de brita	m3	77,710	274,75	R\$ 21.350,82
3.2.3	Cotação	01	Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	m3	181,320	557,02	R\$ 100.998,87
3.2.4	834909	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	580,040	118,35	R\$ 68.647,73
3.2.5	834908	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	m2	121,200	111,28	R\$ 13.487,14
			Sub-total do item Calçadas em concreto				R\$236.037,58
3.3	Rampas para P.N.E. em concreto						
3.3.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	229,50	12,18	R\$ 2.795,31

76,16%

66,52%

85,82%

80,45%

70,46%

70,45%

67,64%

67,29%

67,20%

61,17%

MEDIÇÃO 05			
30/08/2024			
PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS			
INICIO DA OBRA: 02/05/2024			
TERMINO PREVISTO DA OBRA: 29/10/2024			
MEDIÇÃO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
45,95	16.177,62	153,25	53.954,72
185,00	13.791,75	777,00	57.925,35
15,00	931,20	149,00	9.249,92
2,25	410,06	98,17	17.891,48
525,00	6.394,50	1.825,20	22.230,94
15,75	4.327,31	54,75	15.042,55
43,20	24.063,26	122,65	68.318,50
96,50	11.420,78	390,30	46.192,01
30,85	3.432,99	81,45	9.063,74
48,94	596,09	140,39	1.709,95

3.3.2	603900	DER-PR	Lastro de brita	m3	6,850	274,76	R\$ 1.882,11	61,17%	1,46	401,15	4,19	1.151,26	
3.3.3	Cotação	01	Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	m3	16,050	557,01	R\$ 8.940,01		61,18%	3,44	1.916,11	9,82	5.469,83
3.3.4	834908	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	m2	21,600	111,26	R\$ 2.403,22		61,16%	4,60	511,80	13,21	1.469,74
			Sub-total do item Rampas para P.N.E. em concreto				R\$16.020,64						
			Total do Grupo dos Serviços Complementares				R\$274.296,37						
TOTAL DA OBRA COM BDI							R\$442.992,00						
				Quatrocentos e quarenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais									
INACIO MARTINS, 30 DE AGOSTO DE 2024													
CALÇADAS EM CONCRETO E ACESSIBILIDADE - CONVENIO 025/2023 - SEIL													
Contratada: Marly Corvolan Hilario				Keury Fabris Marcon									
CNPJ.: 029.958.184/0001-89				Engenheiro Civil									
Contrato: 026/2024				CREA PR 148398/D RNP 17 14 63 99 91									
Concorrência Eletrônica 001/2024				ART de Execução 17 2024 22 33 000									
				MEDIÇÃO 05									

% PERIODO	19,05%	% ACUM	69,90%
MEDIÇÃO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
R\$ 84.374,62		R\$ 309.669,99	
Oitenta e quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos			
Edison dos Santos Pepe Edison dos Santos Pepe Engenheiro Civil CREA PR 130743/D RNP 17 11 87 89 87 ART de Fiscalização 17 2023 27 87 909			



MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

MUNICÍPIO LOCAL	INÁCIO MARTINS RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI
CONTRATADA CONTRATO Nº OBJETO	CONSTRUTORA MARLY CORVOLAN HILARIO 026/2024 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE
MEDIÇÃO Nº DATA DA VISTORIA	05 30/08/2024

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/08/2024 até 30/08/2024.

Imagem 01 – Foto aérea do local dos serviços de calçadas em concreto executadas – Rua Nair Bastos Druciaki





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 02 – Regularização e compactação



Imagem 03 – Regularização e compactação





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 04 – Lastro de brita e meio fio em concreto



Imagem 05 – Lastro de brita






MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 06 – Lastro de brita



Imagem 07 – Lastro de brita

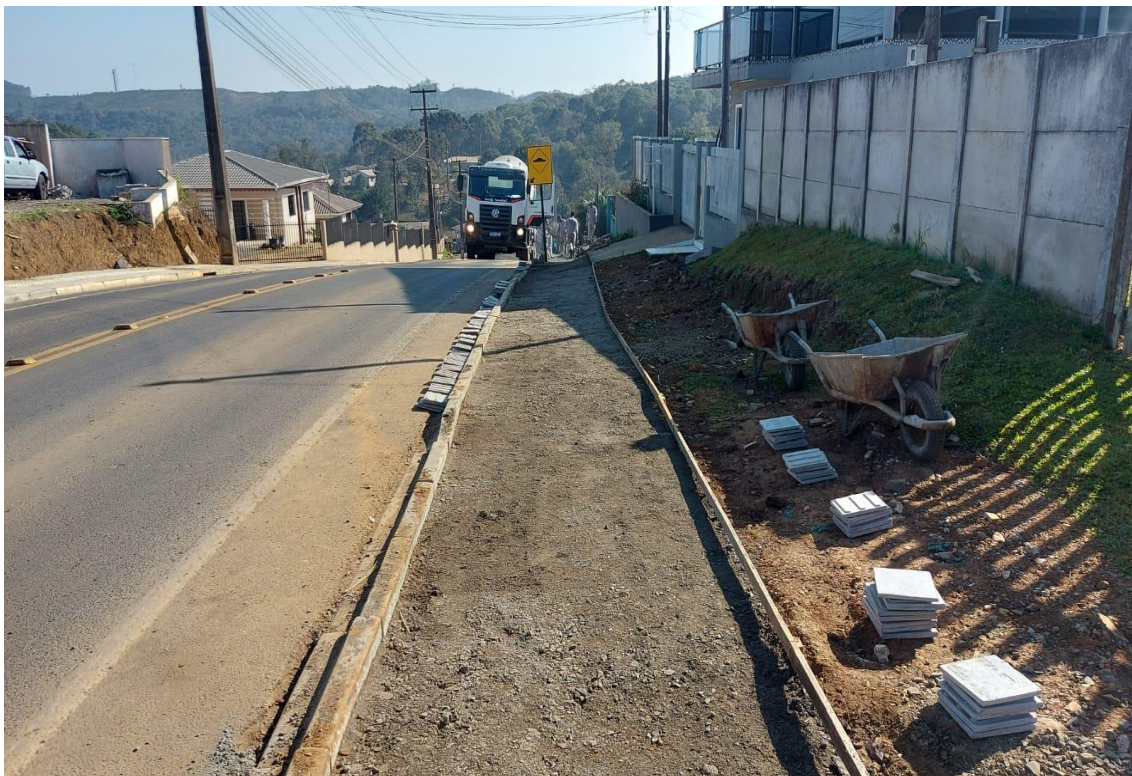



MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 08 – Calçadas em concreto e piso tátil



Imagem 9 – Calçadas em concreto e piso tátil





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 10 – Calçadas em concreto e piso tatil



Imagem 11 – Calçadas em concreto e piso tátil





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. GRUPO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Brita graduada 100% PI	45,95 m ³

2. GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Meio fio e sarjetas	
Meio fio de concreto Tipo 02 (pré-moldado)	185,00 metros
Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - guia rebaixada	15,00 metros

3. GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolições de calçadas em concreto e meio fios	
Demolição de concreto simples	2,25 m ³
Calçadas em concreto - esp 7,0 cm = 2.590,56 m²	
Regularização e compactação manual de passeios	525,00 m ²
Lastro de brita	15,75 m ³
Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	43,20 m ³
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	96,50 m ²
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	30,85 m ²
Rampas para P.N.E. em concreto	
Regularização e compactação manual de passeios	48,94 m ²
Lastro de brita	1,46 m ³
Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	3,44 m ³
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	4,60 m ³

Inácio Martins, 30 de agosto de 2024.

Edison dos Santos Pepe
Engenheiro Civil
CREA PR 130743/D
ART de fiscalização 17 2023 27 87 909
