

PLANILHA DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR

Município : INACIO MARTINS - PR		Data base DER : FEVEREIRO 2023 (sem desoneração)			Elaborado em : 24/10/2023		
Trecho : RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI					Area m²:	2.590,56	
					Extensão m:	866,00	
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR
CALÇADAS EM CONCRETO E ACESSIBILIDADE							
1 GRUPO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
1.1	531000	DER-PR	Brita graduada 100% PI	m3	201,220	352,07	R\$ 70.843,52
Total do grupo de Serviços de Pavimentação							R\$70.843,52
2 GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES							
2.1 Meio fio e sarjeta							
2.1.2	810150	DER-PR	Meio fio de concreto Tipo 02 (pré-moldado)	m	1.168,000	74,55	R\$ 87.074,40
2.1.3	810650	DER-PR	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - guia rebaixada	m	173,610	62,08	R\$ 10.777,71
Total do grupo dos serviços de drenagem e obras de arte correntes							R\$97.852,11
3 GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
3.1 DEMOLIÇÕES DE CALÇADAS EM CONCRETO E MEIO FIO							
3.1.1	606700	DER-PR	Demolição de concreto simples	m3	122,020	182,25	R\$ 22.238,15
Sub total do item demolições de calçadas em concreto e meio fio							R\$ 22.238,15
3.2 Calçadas em concreto - esp 7,0 cm = 2.590,56 m²							
3.2.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	2.590,56	12,18	R\$ 31.553,02
3.2.2	603900	DER-PR	Lastro de brita	m3	77,710	274,75	R\$ 21.350,82
3.2.3	Cotação	01	Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	m3	181,320	557,02	R\$ 100.998,87
3.2.4	834909	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	580,040	118,35	R\$ 68.647,73
3.2.5	834908	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	m2	121,200	111,28	R\$ 13.487,14
Sub-total do item Calçadas em concreto							R\$236.037,58
3.3 Rampas para P.N.E. em concreto							
3.3.1	891070	DER-PR	Regularização e compactação manual de passeios	m2	229,50	12,18	R\$ 2.795,31

85,88%

83,15%

89,51%

87,71%

86,80%

83,08%

80,65%

82,32%

82,30%

63,33%

MEDIÇÃO 06

30/09/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS

INICIO DA OBRA: 02/05/2024

TERMINO PREVISTO DA OBRA: 29/10/2024

MEDIÇÃO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
19,55	6.882,97	172,80	60.837,69
194,20	14.477,61	971,20	72.402,96
6,40	397,31	155,40	9.647,23
8,85	1.612,91	107,02	19.504,40
423,30	5.155,79	2.248,50	27.386,73
9,81	2.695,30	64,56	17.737,85
23,59	13.140,10	146,24	81.458,60
87,20	10.320,12	477,50	56.512,13
18,30	2.036,42	99,75	11.100,17
4,96	60,41	145,35	1.770,36

3.3.2	603900	DER-PR	Lastro de brita	m3	6,850	274,76	R\$ 1.882,11
3.3.3	Cotação	01	Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	m3	16,050	557,01	R\$ 8.940,01
3.3.4	834908	DER-PR	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	m2	21,600	111,26	R\$ 2.403,22
Sub-total do item Rampas para P.N.E. em concreto							R\$16.020,64
Total do Grupo dos Serviços Complementares							R\$274.296,37
TOTAL DA OBRA COM BDI							R\$442.992,00
INACIO MARTINS, 30 DE SETEMBRO DE 2024				Quatrocentos e quarenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais			
CALÇADAS EM CONCRETO E ACESSIBILIDADE - CONVENIO 025/2023 - SEIL							
Contratada: Marly Corvolan Hilario			Keury Fabris Marcon				
CNPJ.: 029.958.184/0001-89			Engenheiro Civil				
Contrato: 026/2024			CREA PR 148398/D RNP 17 14 63 99 91				
Concorrência Eletrônica 001/2024			ART de Execução 17 2024 22 33 000				
			MEDIÇÃO 06				

63,36%	0,15	41,21	4,34	1.192,47
63,36%	0,35	194,95	10,17	5.664,79
63,33%	0,47	52,29	13,68	1.522,04
<p>% PERIODO 12,88% % ACUM 82,79%</p> <p>MEDIÇÃO PERIODO MEDIÇÃO ACUMULADA</p> <p>R\$ 57.067,43 R\$ 366.737,45</p> <p>Cinquenta e sete mil e sessenta e sete reais e quarenta e tres centavos</p>				
 Edison dos Santos Pepe Engenheiro Civil CREA PR 130743/D RNP 17 11 87 89 87 ART de Fiscalização 17 2023 27 87 909				



MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

MUNICÍPIO LOCAL	INÁCIO MARTINS
	RUA NAIR BASTOS DRUCIAKI
CONTRATADA	CONSTRUTORA MARLY CORVOLAN HILARIO
CONTRATO Nº	026/2024
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE
MEDIÇÃO Nº	06
DATA DA VISTORIA	30/09/2024

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/09/2024 até 30/09/2024.

Imagem 01 – Foto aérea do local dos serviços de calçadas em concreto executadas – Rua Nair Bastos Druciaki





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 02 – Regularização e compactação



Imagem 03 – Regularização e compactação





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 04 – Lastro de brita e meio fio em concreto

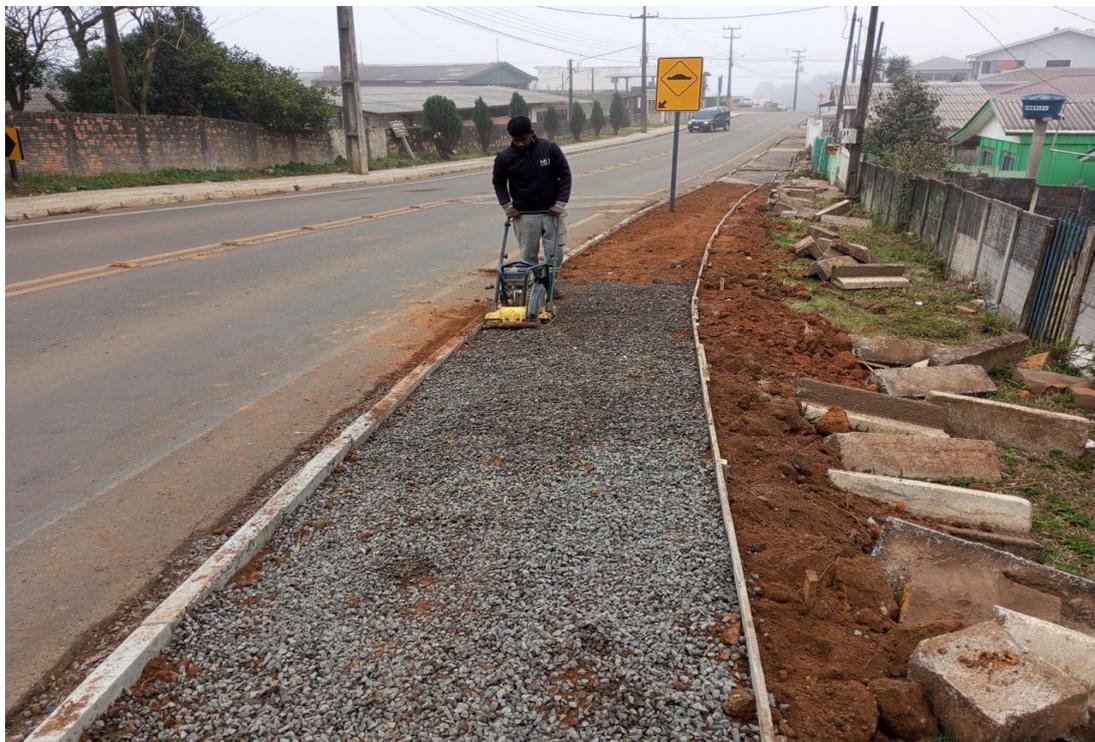


Imagem 05 – Aterro e regularização





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 06 – Meio fio em concreto



Imagem 07 – Brita graduada





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 08 – Meio fio em concreto



Imagem 09 – Lastro de brita





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 10 – Calçadas em concreto e piso tátil



Imagem 11 – Calçadas em concreto e piso tátil





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

Imagem 12 – Calçadas em concreto e piso tátil



Imagem 13 – Calçadas em concreto e piso tátil





MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
ESTADO DO PARANÁ
RUA 7 DE SETEMBRO, 332 – CENTRO - CEP 85.155-000
Fone: (42) 3132-8023

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. GRUPO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Brita graduada 100% PI	19,55 m ³
------------------------	----------------------

2. GRUPO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Meio fio e sarjetas	
Meio fio de concreto Tipo 02 (pré-moldado)	194,20 metros
Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - guia rebaixada	6,40 metros

3. GRUPO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolições de calçadas em concreto e meio fios	
Demolição de concreto simples	8,85 m ³
Calçadas em concreto - esp 7,0 cm = 2.590,56 m²	
Regularização e compactação manual de passeios	423,30 m ²
Lastro de brita	9,81 m ³
Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	23,59 m ³
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	87,20 m ²
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	18,30 m ²
Rampas para P.N.E. em concreto	
Regularização e compactação manual de passeios	4,96 m ²
Lastro de brita	0,15 m ³
Concreto usinado Fck = 15 Mpa, não bombeável, incluso transporte até o local da obra	0,35 m ³
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm incolor	0,47 m ²

Inácio Martins, 30 de setembro de 2024.

Edison dos Santos Pepe

Edison dos Santos Pepe
Engenheiro Civil
CREA PR 130743/D
ART de fiscalização 17 2023 27 87 909
